


BILAN DU CONTRAT DE RIVIERE DU VIAUR



- Bilan Technique et Financier du Contrat de Rivière du Vaur
 - Bilan des Perceptions du Contrat de Rivière du Vaur
- Conclusions Générales et Perspectives

Jun 2005


SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX :

Le réseau de suivi de la qualité des eaux

⇒ 19 points de suivi de la qualité physico chimique des eaux (plus 2 points "mobiles")

⇒ 8 points de suivi de la qualité hydrobiologique (une année sur deux)


⇒ 3 points tournants d'analyse de la qualité des eaux souterraines




**Taux de Réalisation
Technique : 633 %** (suivi prévu
sur 3 points ; 19 points effectivement suivis)

**Taux de Réalisation
Financier : 313 %**

Bilan Financier

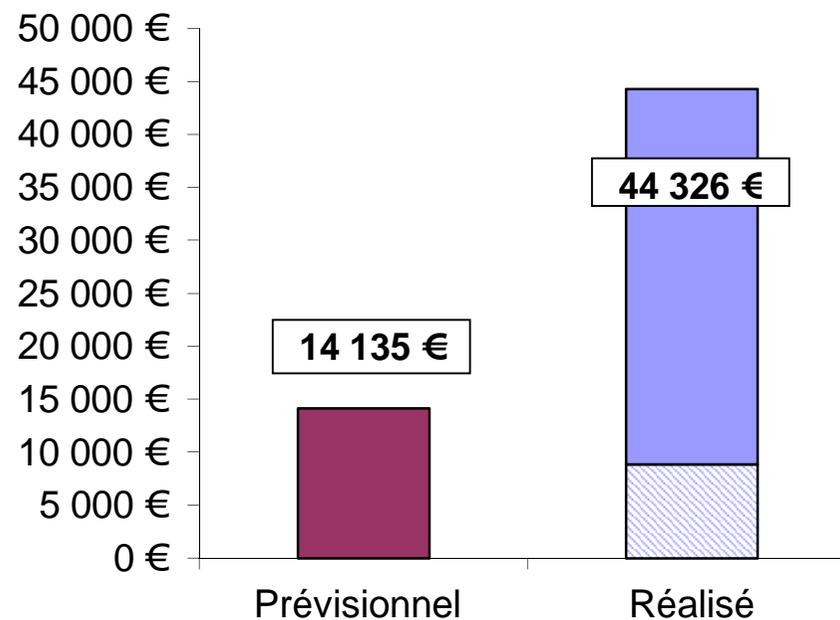

Le constat sur la qualité actuelle de nos cours d'eau : Première approche



Evolution de la grille d'exploitation des résultats : difficulté de comparaison des 2 cartes
Peu de recul : deux années d'analyses

POINTS FORTS



- Programme de suivi complet sur les eaux superficielles (physico, lbgn)
- Effort financier du SMBVV et des partenaires (AEAG, Europe, Conseil Général)
- Améliorations notables en liaison avec les travaux réalisés
- Diminution de la fréquence des pics d'ammoniac enregistrés

POINTS FAIBLES

- Paramètre déclassant est surtout le paramètre Nitrates (>10 mg/l : jaune ; >25 mg/l orange). On constate une tendance à l'augmentation du bruit de fond en nitrates
- Le bassin versant du Giffou et du Cône : le taux de nitrates est très élevé. Les matières azotées (formes instable d'azote) présentent aussi un fort taux.
- Analyses d'eau souterraines : Les taux de nitrates relevés sont forts : sur 10 points mesurés 7 dépassent les 50 mg/l dont 3 dépassent les 90 mg/l.
Méconnaissance du fonctionnement des eaux souterraines
- Manque de "recul" pour disposer d'une bonne analyse de l'évolution de la qualité des eaux



PROGRAMME DE DEPOLLUTION DOMESTIQUE :



Les Schémas d'Assainissement

→ Couverture totale du bassin versant du Viaur

Taux de Réalisation Technique : 182 %
(17 prévus 31 réalisés)



Taux de Réalisation Financier : 125 %

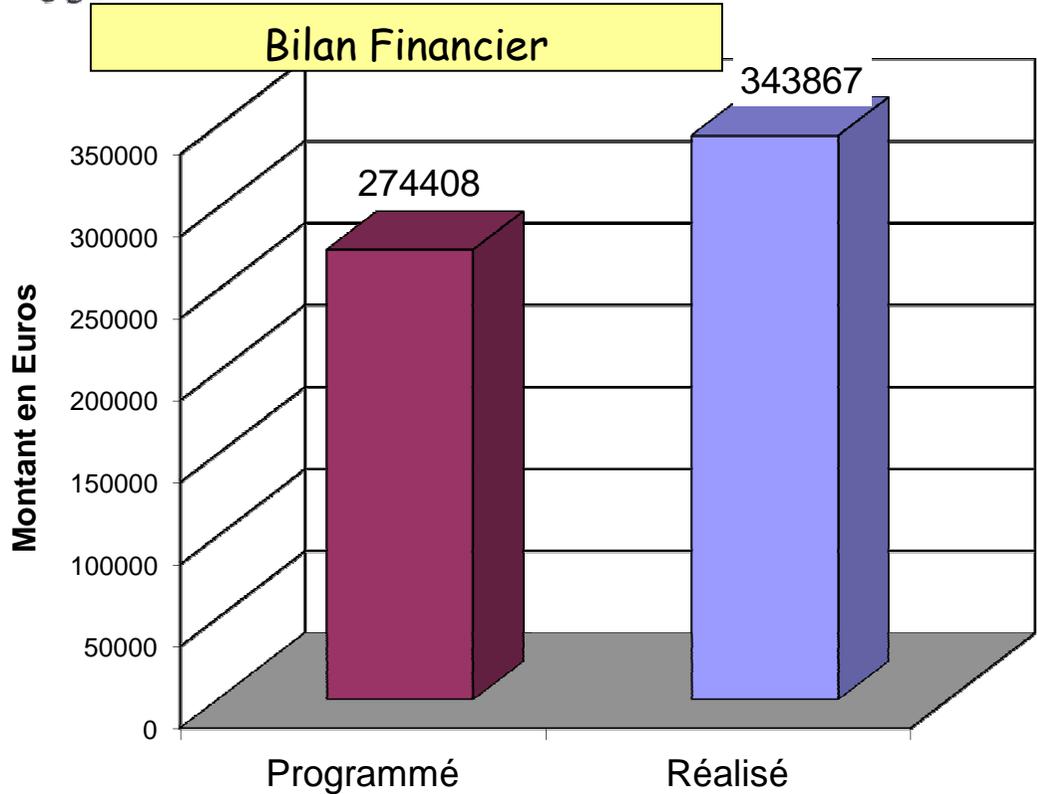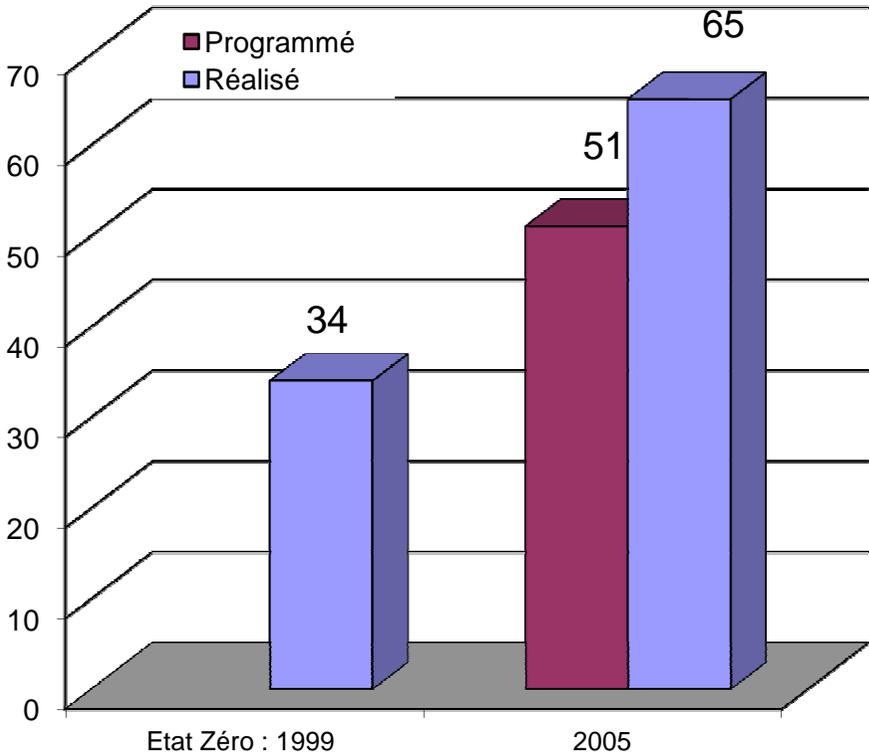

Travaux d'Assainissement Collectif



Taux de Réalisation Réseaux : 184 %

Taux de Réalisation Station Epuration : 77,3 %



Taux de Réalisation Financier 115 %

Bilan Financier

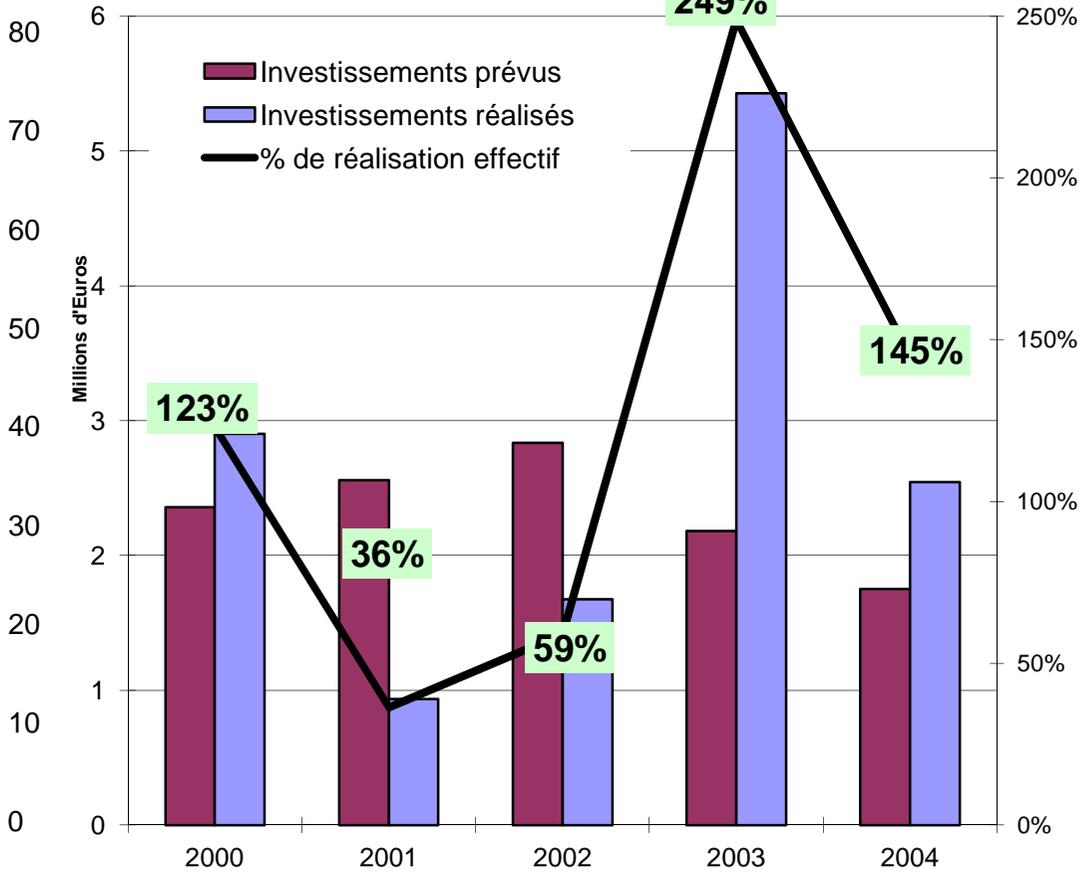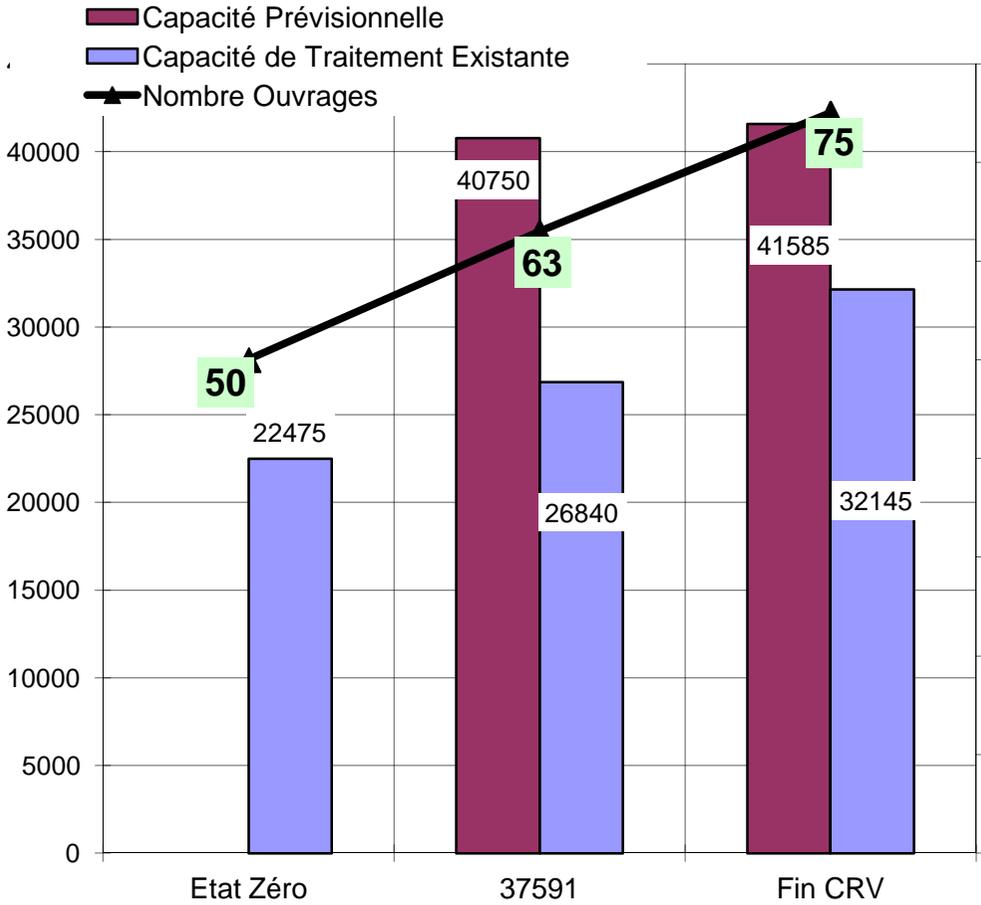

Assainissement Non Collectif : création des SPANCS


Taux de Réalisation Technique : 450 %




Taux de Réalisation Financier : 193 %

9 SPANCS CREES

86 % de la population éparse couverte par un SPANC

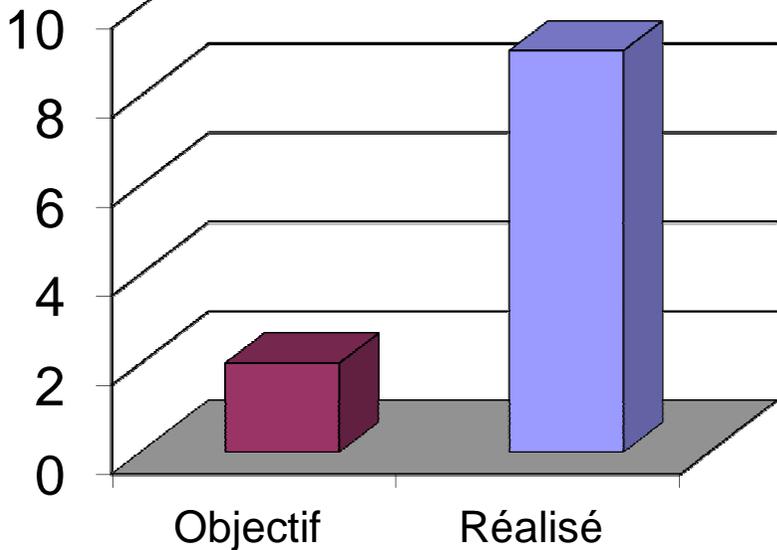


Bilan Financier

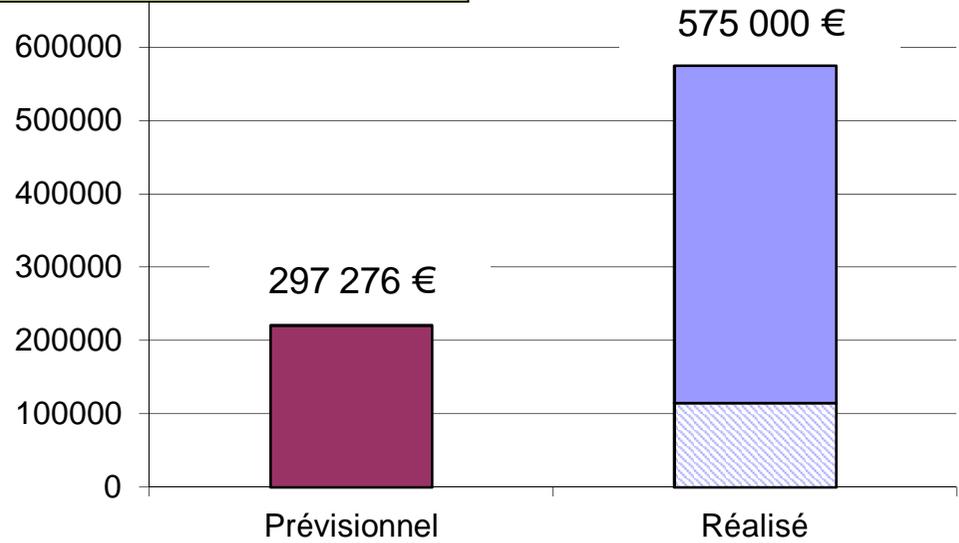

POINTS FORTS




- Schéma d'Assainissement : couverture totale du bassin
- Capacité de traitement des stations du bassin : augmentation de 9670 équivalents habitants
- Service Public d'Assainissement Autonome (SPANC) : 86 % de la population éparsée couverte, lancement d'opérations de réhabilitation



POINTS FAIBLES

- Des bourgs prioritaires restent à assainir : Baraqueville, Pont de Salars, Salles Curan
- Travail en assainissement collectif et non collectif à mener autour des grands lacs de Pont de Salars et Pareloup dans un objectif baignade
- Problèmes de rendement de certaines stations d'épuration
- Travaux de réhabilitation de l'Assainissement non Collectif difficiles à mettre en oeuvre



MAITRISE DES POLLUTIONS D'ORIGINE AGRICOLE :


Opération coordonnée et Mise aux normes des bâtiments d'élevages

Taux de Réalisation Technique : 7,5 %
(22 traités sur 290 prévus)




Taux de Réalisation Financier : 9,7 %
(sur op Coordonnée)

Bilan Technique Global :

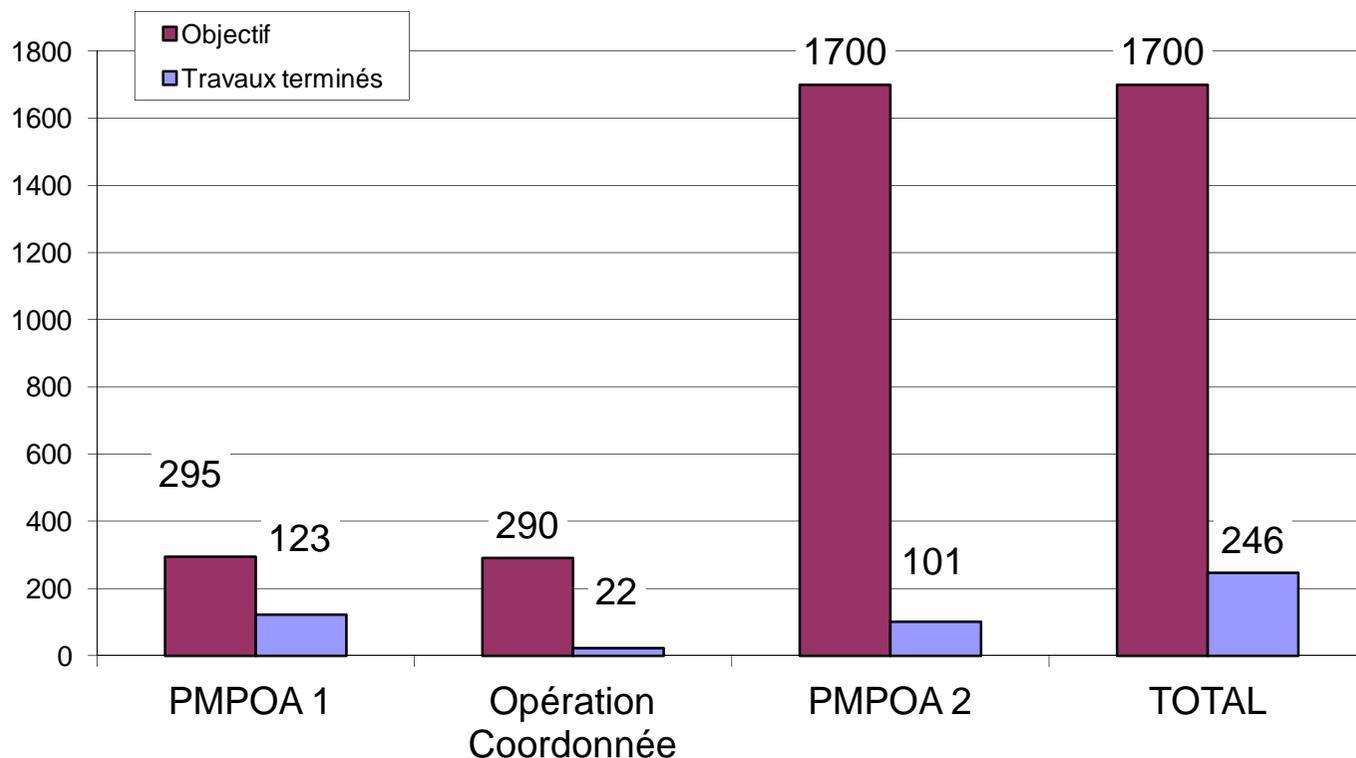


Bilan Financier

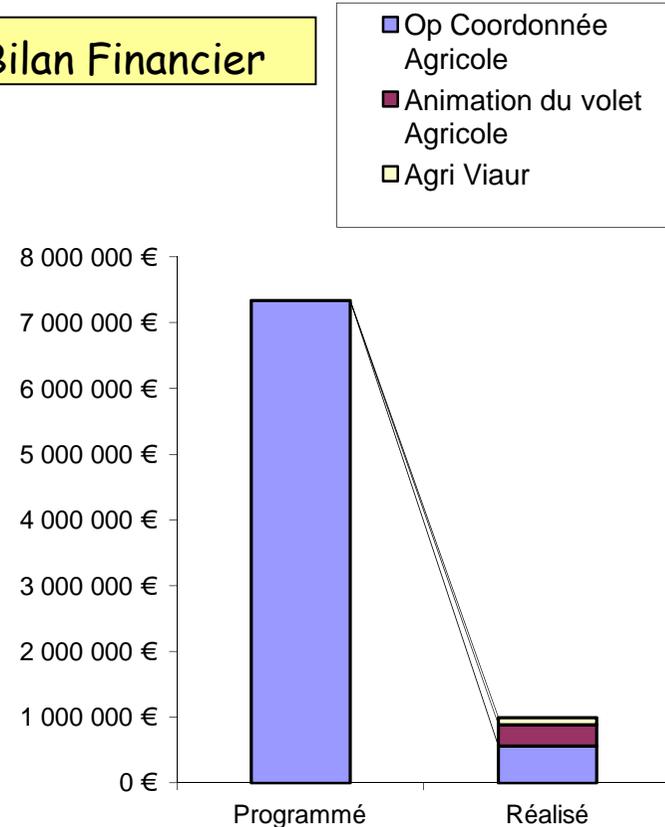

Les Pratiques Agricoles et l'Animation Agricole




Les CTE et CAD

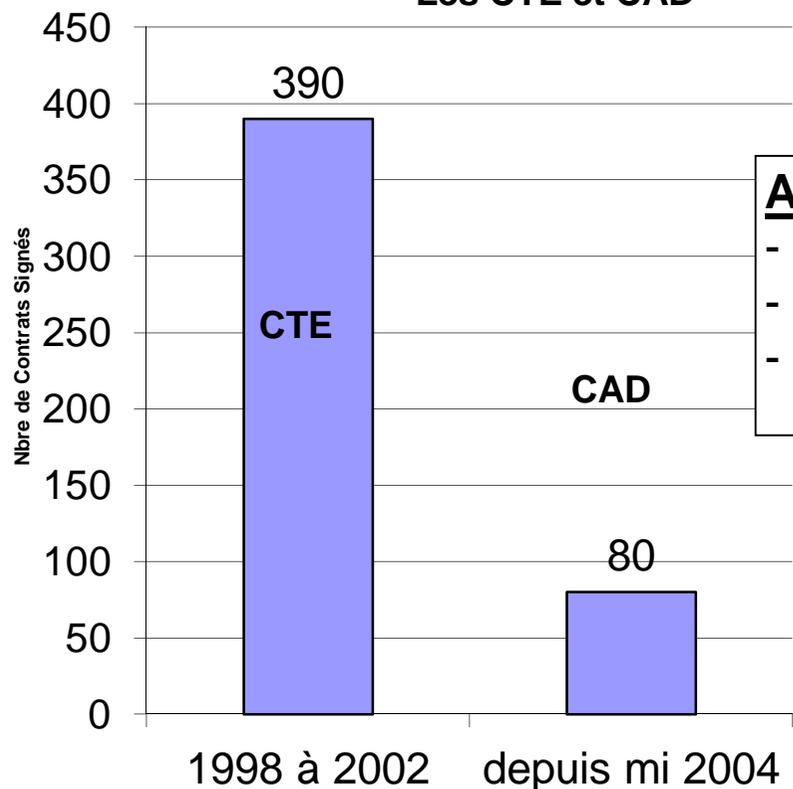

Actions réalisées sur le Viaur depuis 2004 c'est aussi

- 600 agriculteurs présents à des journées de formation
- 20 rencontres coin de champs
- 50 conseils individualisés réalisés

Actions de communication réalisées par Agri Viaur

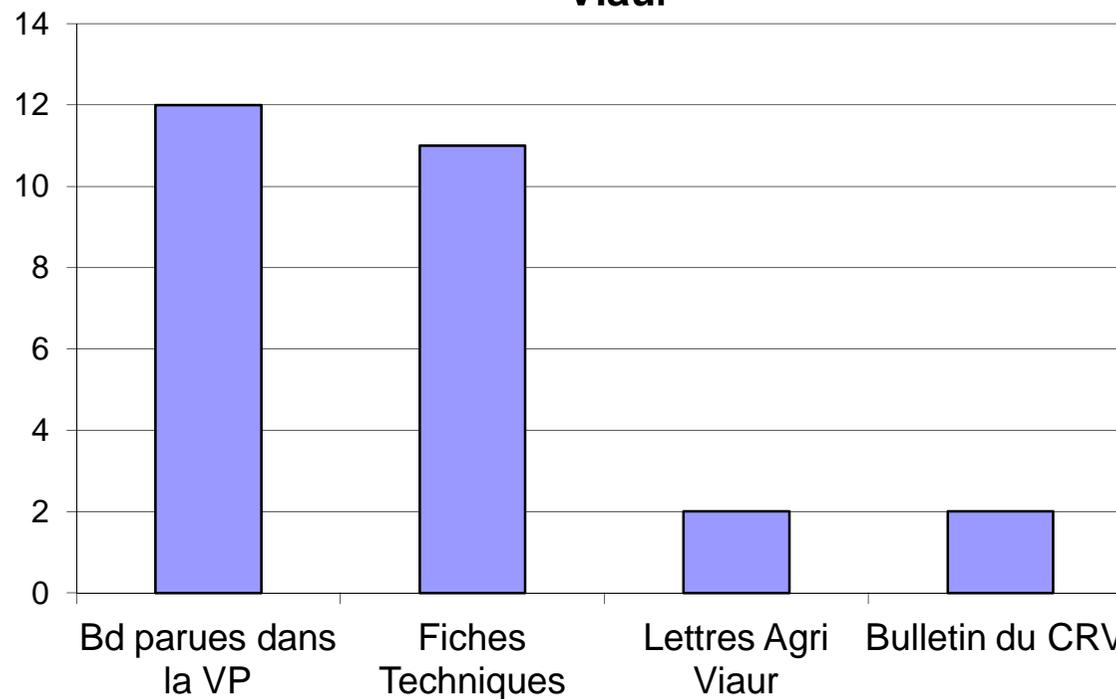

Toutes les actions de sensibilisation : sont présentées sur le Site Internet du CRV

POINTS FORTS

- Opération AGRI VIAUR couvre la totalité du bassin
- Amélioration des pratiques
- PMPOA 2 : possibilité de traiter toutes les exploitations du bassin
- CTE et CAD : possibilité de contractualisation sur le bassin du Viaur
- Dynamisme et volonté des agriculteurs

POINTS FAIBLES

- Mise aux normes des bâtiments d'élevage :
 - opération coordonnée : peu d'exploitations traitées
 - difficultés de réalisation du PMPOA 2 dans le temps imparti (fin du programme en 2006)
- Partie tarnaise du bassin : non inscrite en ZVN
- Animation insuffisamment ciblée



PROTECTION DE LA RESSOURCE DESTINEE A L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE :

**Taux de Réalisation
Technique : 175 %**



**Taux de Réalisation
Financier : 359 %**

POINTS FORTS

- Lancement des procédures de protection des captages : volonté des structures
- Réflexions engagées par les structures d'adduction sur l'ensemble de leurs installations (points de prélèvements, traitement, distribution)
- Préparation d'un schéma départemental de l'eau potable




POINTS



- Lourdeur et longueur de la procédure administrative de protection des captages destinés à l'alimentation en eau potable
- Nécessité d'améliorer les rendements des réseaux de distribution d'eau potable

Périmètres de Protection des captages

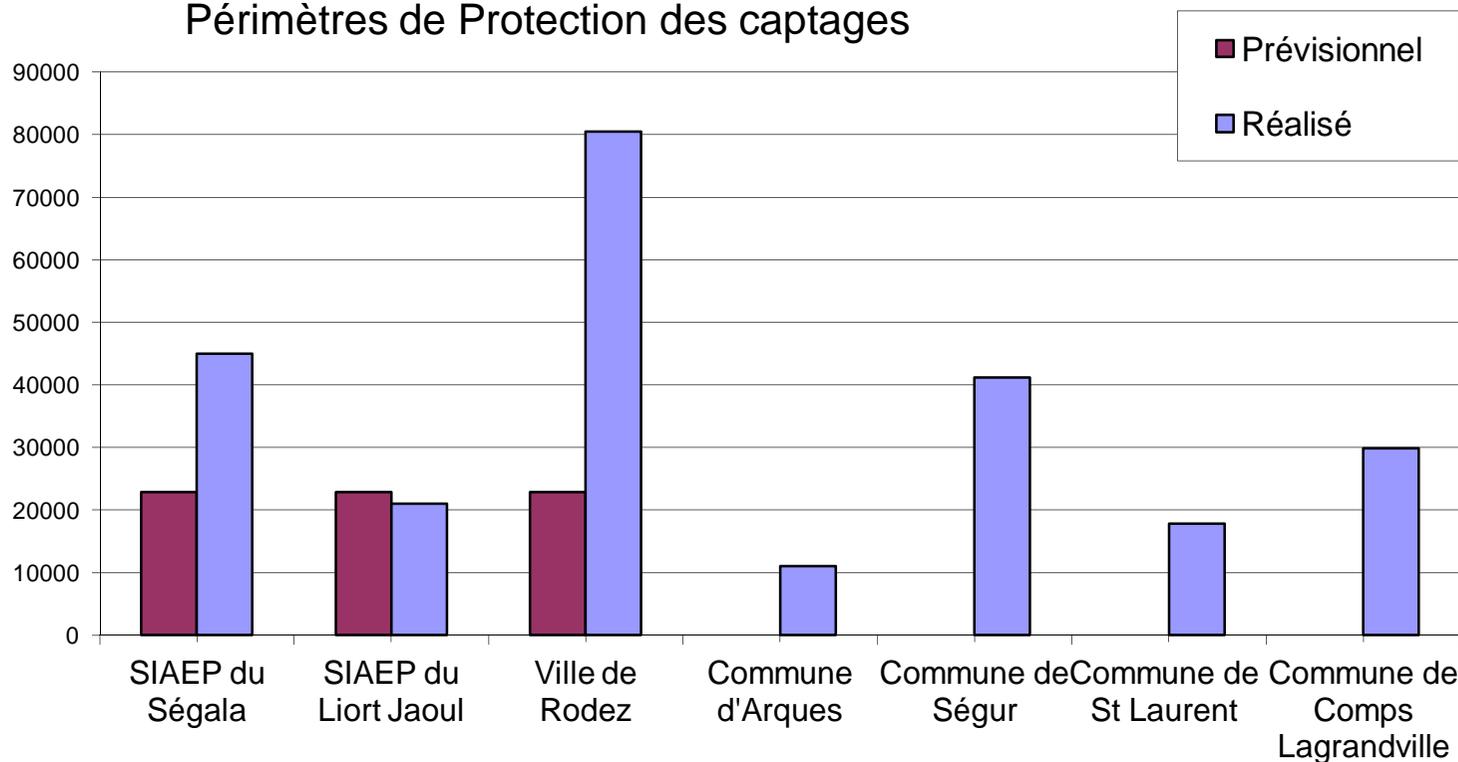

GESTION DE LA VEGETATION DES BERGES : RESTAURATION, ENTRETIEN ET SUIVI DES TRAVAUX

**Taux de Réalisation
Technique : 135 %
(sur travaux)**




**Taux de Réalisation
Financier : 97,9 %**




**RESTE A TRAITER
27 % DU LINEAIRE**

Linéaires traités :

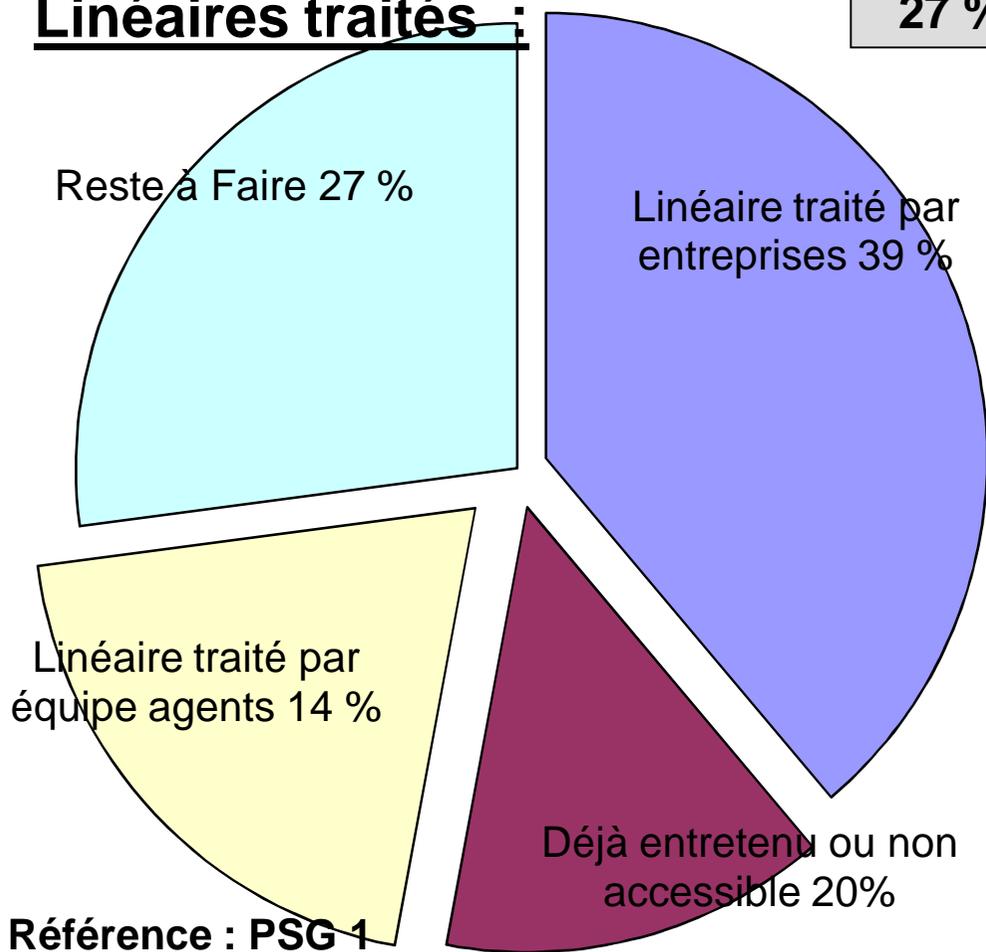

Bilan Financier

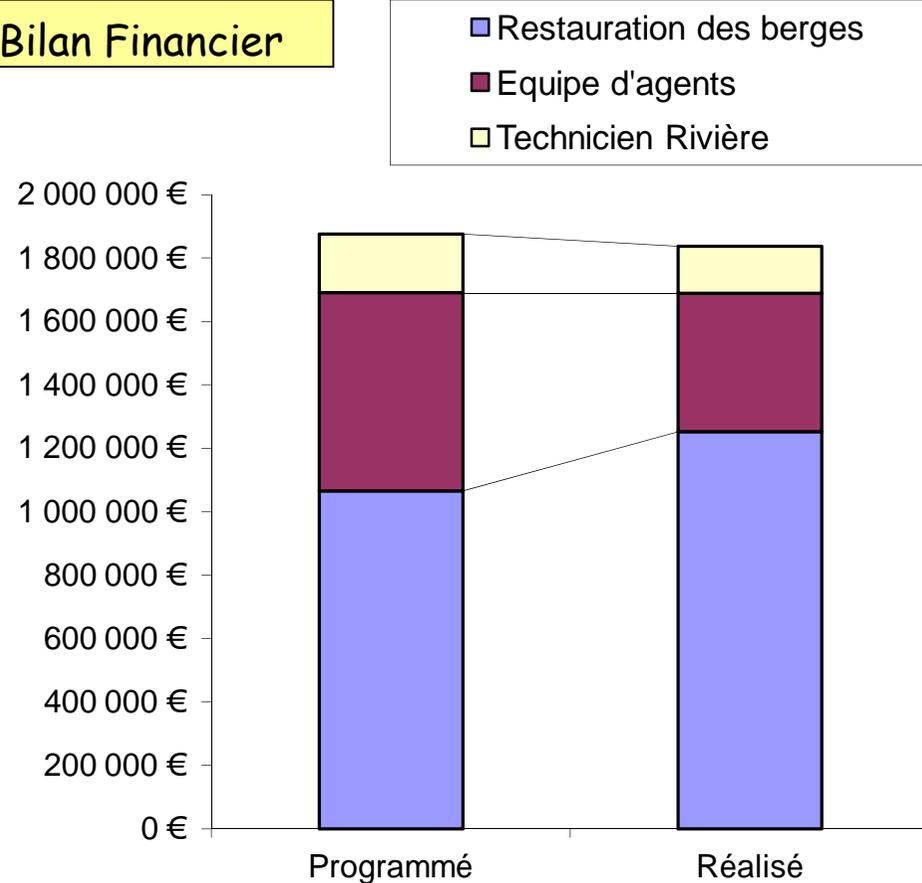

POINTS FORTS

- 
- Travail moteur dans l'adhésion des collectivités au Contrat de Rivière et très bon engagement et volonté des collectivités
 - 470,8 km de berges traités au total soit 53 % du linéaire, sachant que sur 20 % du linéaire aucun travaux ne sea réalisé (inaccessible ou déjà entretenu): donc 73 % du linéaire est considéré comme réalisé (réf PSG 1)
 - Equipe d'agents d'entretien permettant :
 - souplesse et rapidité d'intervention
 - contact de proximité, sensibilisation des riverains
 - travail très soigné et suivi
 - réponse à des besoins spécifiques et ponctuels
 - Rentabilité évidente de l'équipe d'agents d'entretien
 - Présence d'un technicien coordonnateur de tous les travaux réalisés

POINTS FAIBLES

- 
- Volume de travaux importants entraînant un léger retard de réalisation
 - La programmation des travaux est réalisée 5 années auparavant, il est donc nécessaire de la réajuster chaque année avant la réalisation des travaux
 - L'équipe d'agents d'entretien (4 agents) ne peut répondre sur ce territoire très vaste à tous les besoins des milieux et demandes des collectivités (il était prévu de recruter 6 agents)
 - Manque de moyens humains pour :
 - suivre la totalité du linéaire : surveillance de la rivière (967 km)
 - organiser et planifier les travaux, travailler en réseau avec les autres techniciens
 - Structurer et anticiper les besoins

GESTION DES ZONES HUMIDES

POINTS FORTS

- 227 hectares sous contrat
- Présence d'une animation sur ce thème
- Très grande richesse floristique et faunistique de ces zones sur le bassin


POINTS FAIBLES

- Actions de drainage
- Difficultés de lisibilité des diverses actions menées
- Peu de moyens pour convaincre les propriétaires d'assurer la gestion de ces zones


Taux de Réalisation Technique : 147 %

Taux de Réalisation Financier : 147 %
(sur opération estimée dans prévisionnel)

Bilan Technique

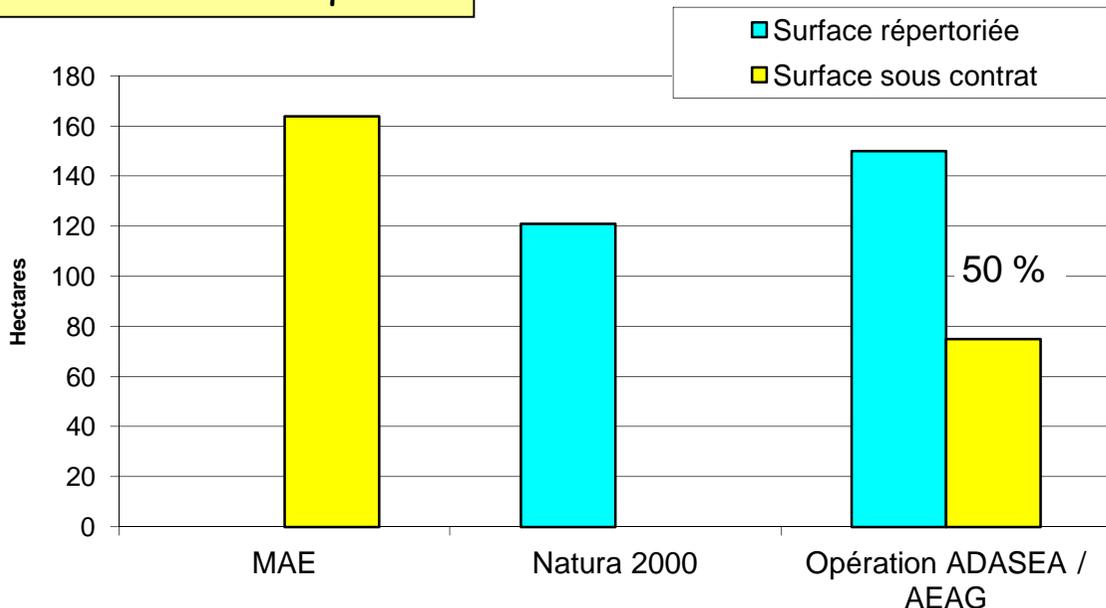

Bilan Financier

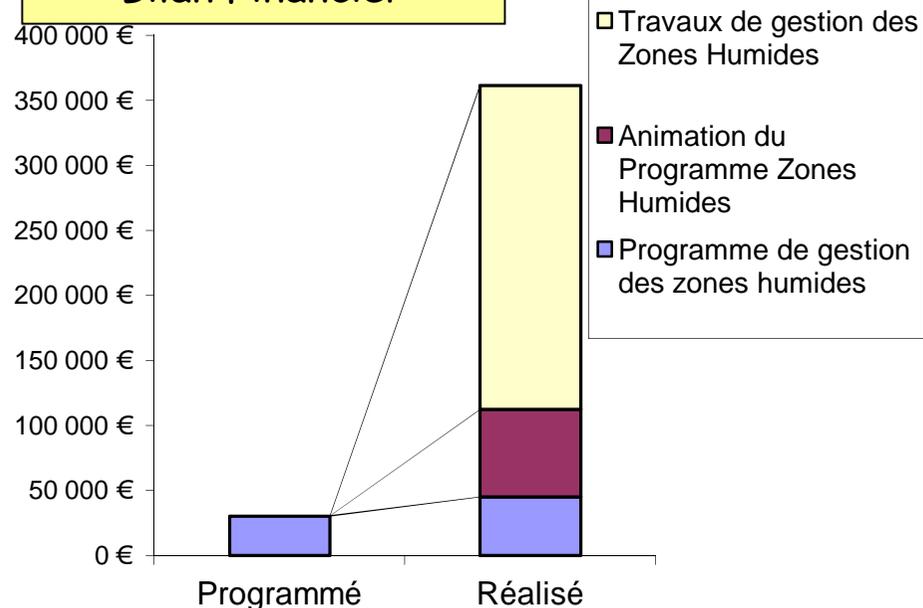

GESTION PISCICOLE

POINTS FORTS


- Dispositifs de franchissement : réalisation de 10 ouvrages fonctionnels
- Etude concernant les seuils : nombre d'ouvrages étudiés largement supérieur au prévisionnel : inventaires et données primordiales pour une bonne gestion
- Création d'une association halieutique : Halieuti Viaur
- Volonté de réalisation d'actions concrètes

POINTS FAIBLES

- Difficultés de mise en œuvre d'opérations satisfaisant l'ensemble des partenaires
- Pas de programme d'actions concertées et coordonnées à l'échelle du Viaur : pas de technicien piscicole sur notre territoire et pas de travaux réalisés

Taux de Réalisation Financier : 80 %

Bilan Financier

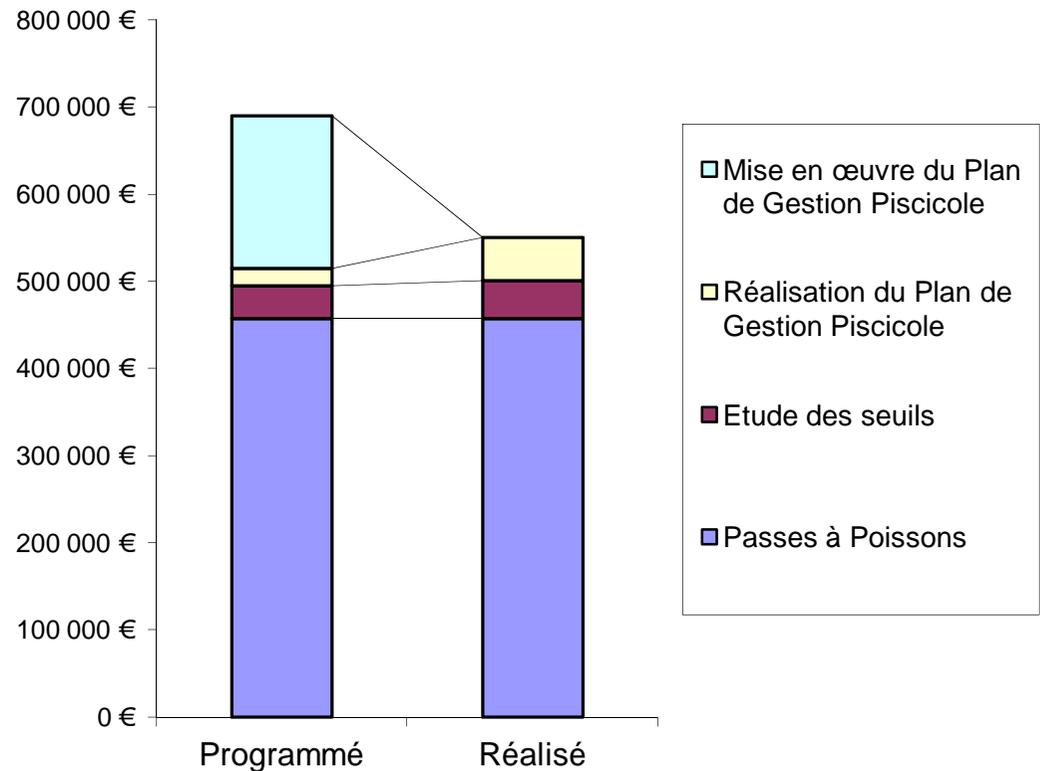

POINTS FORTS

- Mise en place d'un travail autour de la gestion des prélèvements : début de concertation
- Résolution des problèmes d'assec sur le Vioulou amont
- Avancement du Plan de Gestion des Etiages : validation technique et création d'une entente inter départementale


POINTS FAIBLES

- Pas de fiabilisation des stations de mesures limnimétriques : les mesures d'étiages sont donc peu fiables
- Les annonces de crues sont apparues au cours du contrat comme ne prévenant pas suffisamment rapidement
- Difficulté de traiter le problème de la gestion quantitative car :
 - la meilleure échelle pour traiter cette problématique reste le bassin versant Aveyron (intégrant le Viaur)
 - les outils à notre disposition ne sont pas assez puissants : concertation et négociation uniquement

**Taux de Réalisation
Financier : 0 %**




GESTION ET VALORISATION DES PAYSAGES




- **Potentiel important** : vallée préservée, sauvage et au patrimoine naturel très diversifié et très riche
- Tissu d'association dense et dynamique
- Très bon engagement de la part des collectivités et acteurs locaux
- Prise en compte de l'environnement dans les projets menés par les acteurs du territoire

- Très grande différence selon les secteurs, du niveau de valorisation et de fréquentation
- Difficulté de définition d'axes fédérateur à l'échelle du bassin versant du Viaur
- Difficulté de perception de l'entité Viaur : aucun axe ne suit le Viaur



Bilan Financier


REPARTITION DES "OPERATIONS"

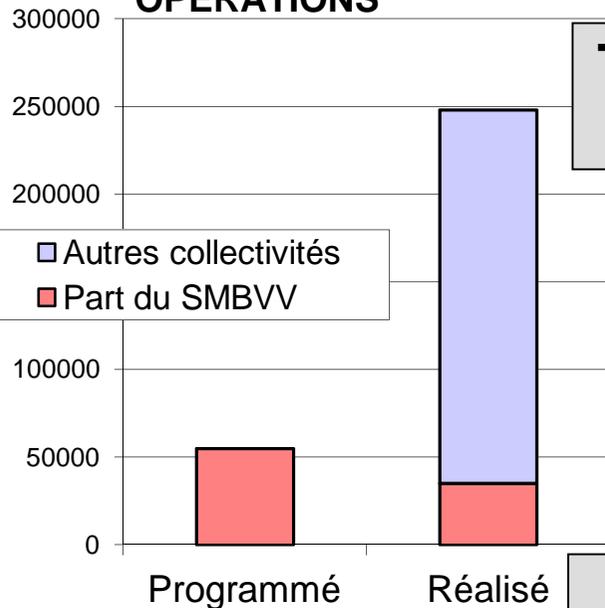

Taux de Réalisation Technique : 552 %



Taux de Réalisation Financier : 1004 %

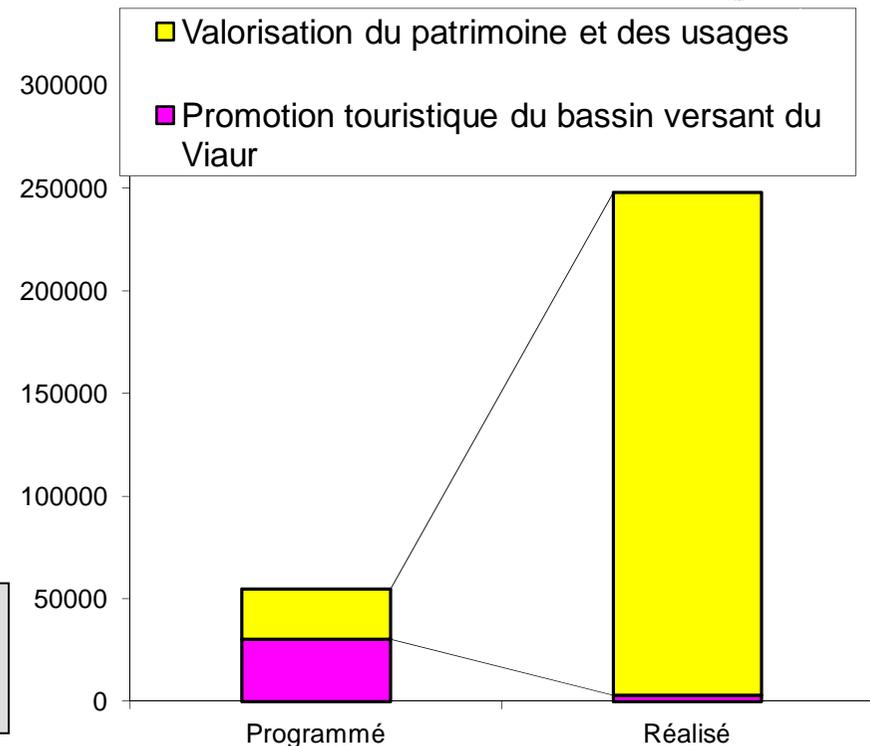


POINTS FORTS

- 
- Création du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Viaur
 - Réseau important de relations avec tous les partenaires départementaux et régionaux
 - Echanges riches et ouverts entre les usagers, et les acteurs : ampathie des acteurs
 - Présence d'une coordination du programme
 - De nombreux outils et moyens de communication
 - Certaines communes distribuent le bulletin d'information à chaque foyer de leur territoire (8 bulletins d'informations imprimés à 20000 exemplaires chacun)
 - Réussite et implication des populations au cours des différentes fêtes du Viaur
 - Edition de 7 ouvrages sur la vallée du Viaur
 - Création d'un site Internet très riche et complet (environ 15 visites par jour)
 - Succès du programme scolaire : très bon taux de participation, écoles motivées pour poursuivre ces animations et s'y investir
 - Lors de la fête du Viaur une journée est entièrement consacrée aux scolaires
 - Création d'outils adaptés aux thématiques traitées et au territoire. Outils très concrets et utilisables directement sur le terrain.

POINTS FAIBLES

- 
- Certains intervenants sur la gestion des milieux n'ont pas été "touchés" (forestiers...)
 - Difficultés de sensibiliser le grand public
 - Certaines écoles n'ont pas encore fait appel au programme d'animation proposé



**Taux de Réalisation
Technique : 195 %**




**Taux de Réalisation
Financier : 146 %**

Bilan Financier


- Programme de sensibilisation des scolaires
- Opération de Communication
- Animation du Contrat de Rivière du Viaur

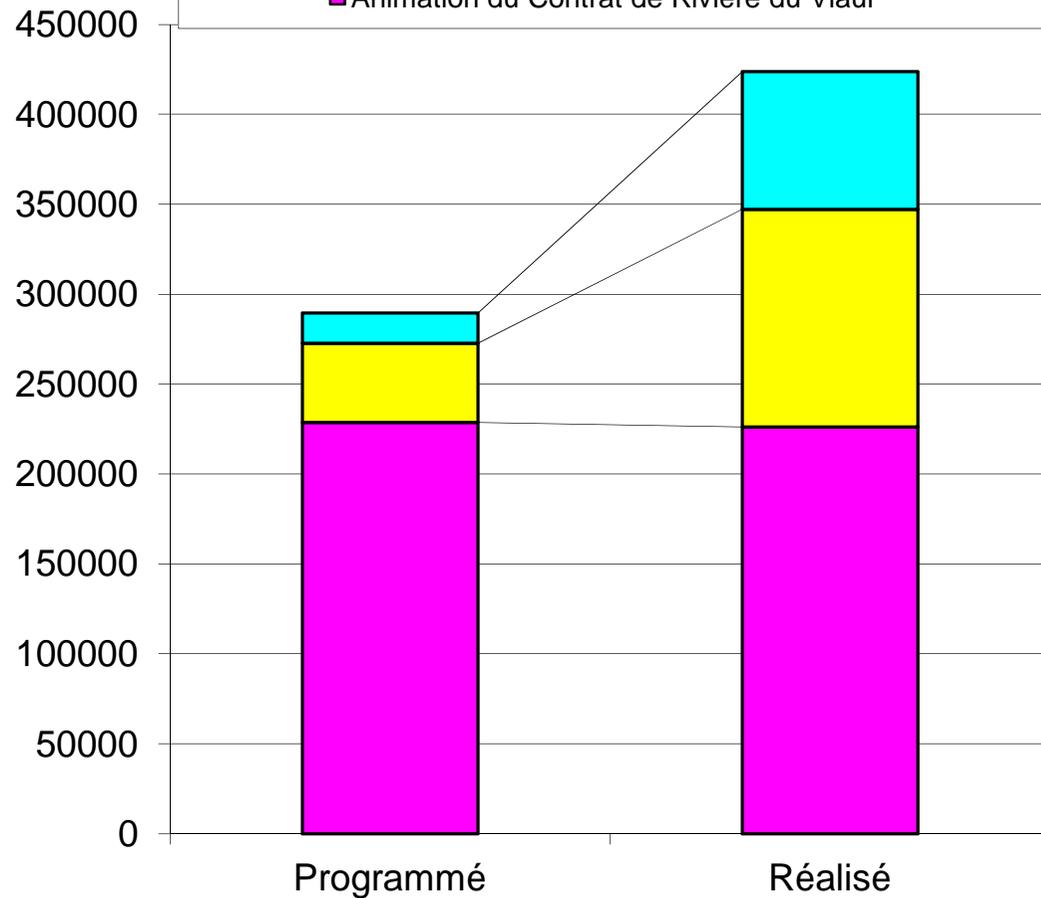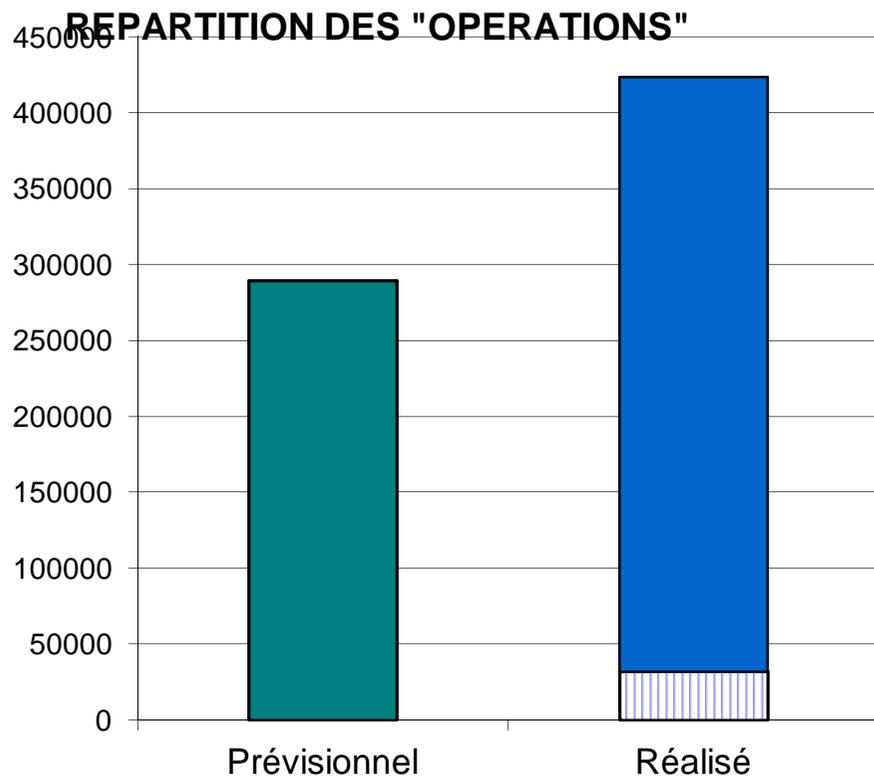

COMPARATIF : PROGRAMME INITIAL / **PROGRAMME REALISE**

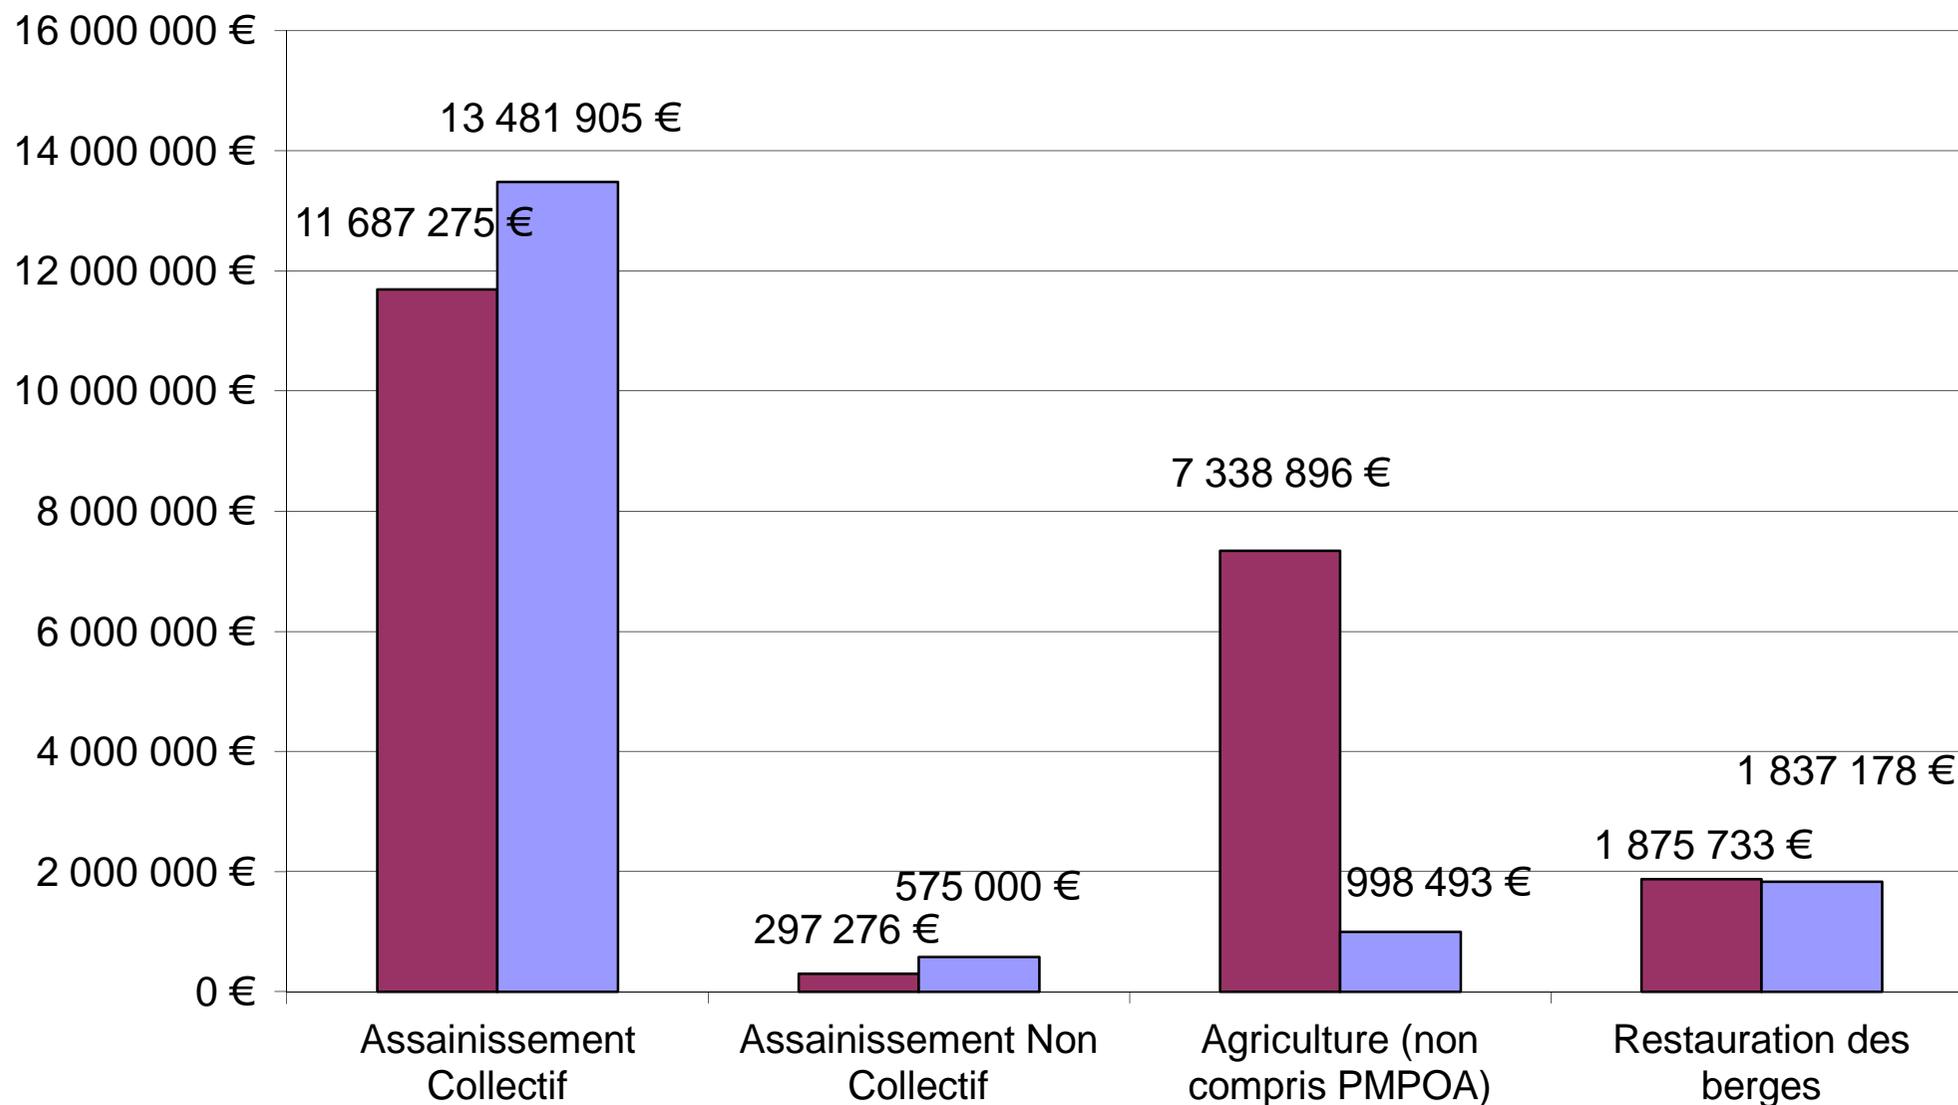

COMPARATIF : PROGRAMME INITIAL / **PROGRAMME REALISE**

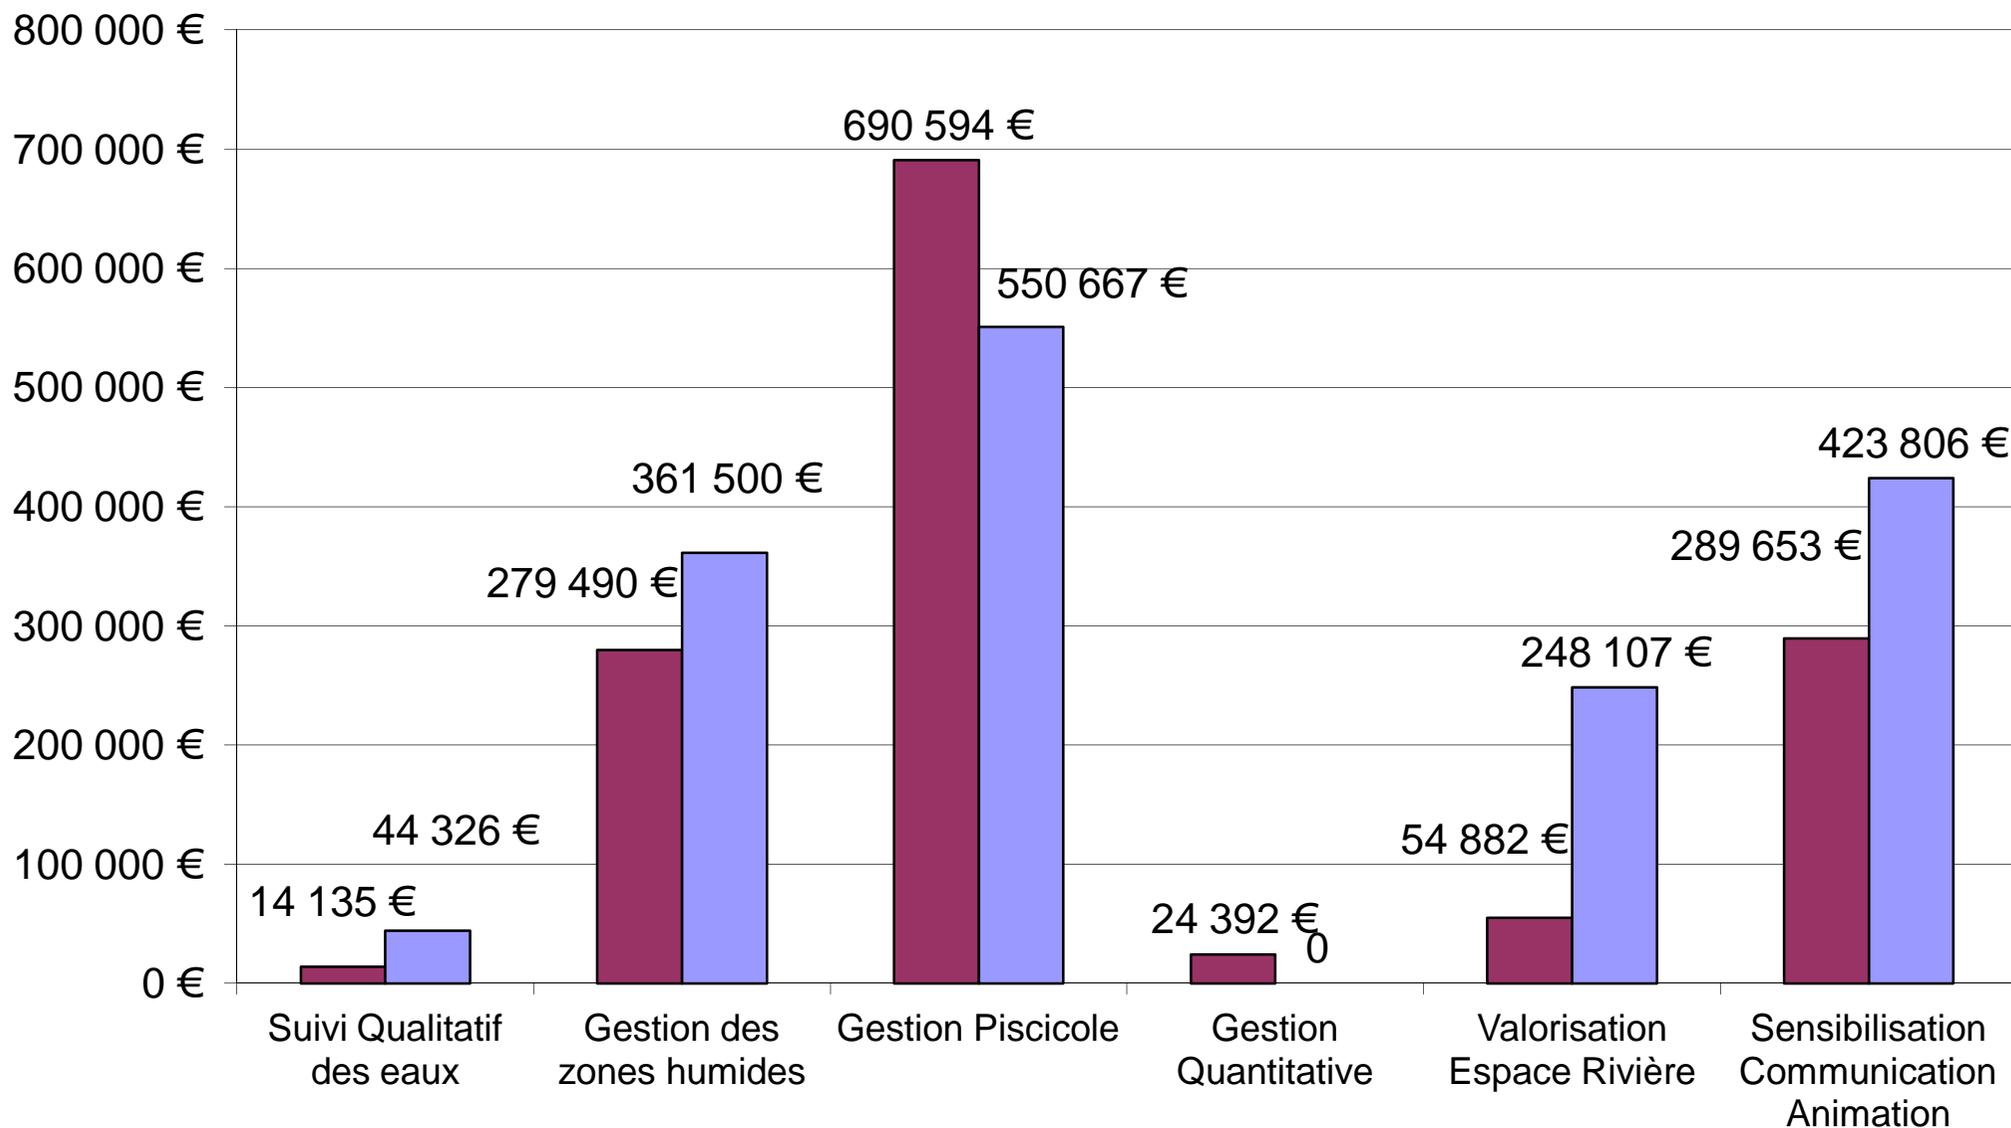

COMPARATIF : PROGRAMME INITIAL / PROGRAMME REALISE

**Soit 83 % du
prévisionnel réalisé**

REPARTITION DES VOLUMES

- Assainissement
- Agriculture
- Travaux de restauration des berges et des milieux aquatiques
- Suivi qualité, Protection ressource AEP Quantité
- Valorisation Rivière
- Sensibilisation Communication Animation

